



UNACHI

DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA 2024

DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA

A continuación, presentamos un resumen de la ejecución de los proyectos y actividades del año 2024 del mes Noviembre.

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO REGIONAL DE TIERRAS ALTAS DE LA UNACHI

Licitado y adjudicado al Contratista R&G constructora S.A. por un monto de B/. 370,725.00 en ejecución, mantiene un avance del 35% en septiembre de 2024.

Orden de proceder: 30 de agosto del 2023 al 25 de febrero de 2024. El proyecto se encuentra actualmente en la fase de diseño de planos y tramitación del permiso de construcción en el Municipio de Tierras Altas. En trámite de Adenda.



UNACHI

DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA 2024

PROYECTO MEJORA DE CUBIERTA PARA EDIFICIO DE CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS DE LA SEDE DE LA UNACHI.

Licitado y adjudicado a la empresa Arteliz Construcciones, S.A., por un valor de B/.232,020.59, tiene un avance de 2% en noviembre 2024.

Orden de proceder: 26 de diciembre 2023 al 24 de marzo 2024.

El proyecto se encuentra ejecutado al 100%. El proyecto presentó atraso en la entrega final y se le cobro multa al contratista. Finalizó el 19 de noviembre de 2024.



☎ 730-5300 ext. 1402

🌐 www.unachi.ac.pa

Acreditada por el CONEUPA, Resolución AI-009-2022



UNACHI

DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA 2024

MANTENIMIENTO DE PINTURA DEL GIMNASIO DE LA UNACHI.

Licitado y adjudicado a la empresa GB Arquitectos, S.A., por un valor de B/.19,370.74, con un avance de 0% en noviembre 2024.

Orden de proceder: 07 de agosto al 18 de agosto 2024.

El proyecto se encuentra actualmente en ejecución con un avance aproximado del 70%. El proyecto se reanudó el día 11 de diciembre de 2024. En reunión previa con el Departamento de Asesoría Legal, Departamento de Salud Ocupacional y el Departamento de Ingeniería y Arquitectura, se revisó toda la documentación entregada por la empresa contratista y se llegó a la conclusión de que cumplían con todo lo solicitado para el reinicio de la obra.



☎ 730-5300 ext. 1402

🌐 www.unachi.ac.pa

Acreditada por el CONEAUPA, Resolución AI-009-2022



UNACHI

DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA 2024

PROYECTO ADECUACIÓN A LA PARADA PRINCIPAL DE BUSES DE LA UNACHI.

Licitado y adjudicado a la empresa Geisa Internacional, S.A., por un valor de B/.61,308.27, tiene un avance de 90% en noviembre 2024.

Orden de proceder: 24 de octubre 2024 al 07 de diciembre 2024.

El proyecto se encuentra ejecutado al 100%.



📞 730-5300 ext. 1402

🌐 www.unachi.ac.pa

Acreditada por el CONEUPA, Resolución AI-009-2022



UNACHI


DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA 2024

PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE MARQUESINA PARA ENTRADA DE LABORATORIOS DE HONGOS DE LA UNACHI.

Licitado y adjudicado a la empresa Construcciones y Diseños Generales SH, S.A., por un valor de B/.8,174.00, tiene un avance de 40% en noviembre 2024.

Orden de proceder: 21 de noviembre 2024 al 15 de diciembre 2024.

El proyecto se encuentra actualmente en ejecución y lleva un avance aproximado del 40%.

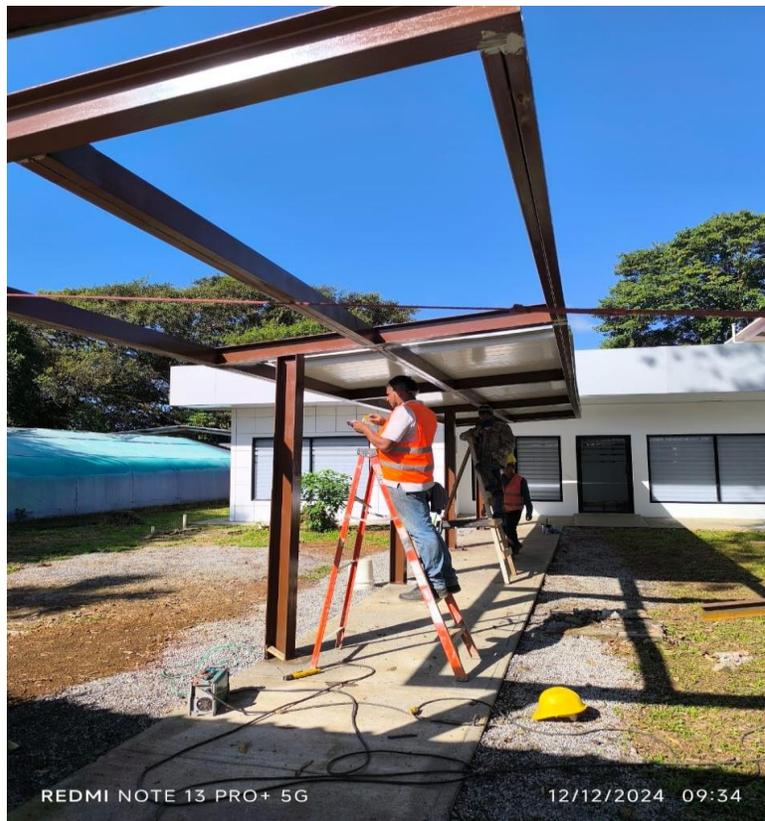

Realizado por: Ing. Carlos Santamaría

📞 730-5300 ext. 1402

🌐 www.unachi.ac.pa

Acreditada por el CONEUPA, Resolución AI-009-2022
