



DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA

A continuación, presentamos un resumen de la ejecución de los proyectos y actividades del año 2026 del mes mayo.

CONSTRUCCIÓN DE LA CUARTA FASE DEL EDIFICIO DE 18 AULAS DE LA UNACHI

Licitado y adjudicado al Contratista Grupo Jaramillo, S.A. por un monto de B/. 184,768.90, mantiene un avance del 97% en abril de 2026.

Orden de proceder: 08 de octubre del 2025 al 06 de marzo del 2026.

El proyecto se encuentra actualmente en fase de construcción.






MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PROFUNDO DE LOS GENERADORES DE LA SEDE CENTRAL Y EXTENSIONES DE LA UNACHI.

Licitado y adjudicado al Contratista SERVICIOS ELÉCTRICOS INDUSTRIALES, S.A. por un monto de B/. 23,498.00, mantiene un avance del 100% en mayo de 2026.

Orden de proceder: 28 de abril del 2026 al 22 de mayo del 2026.

El proyecto se encuentra actualmente en ejecución.

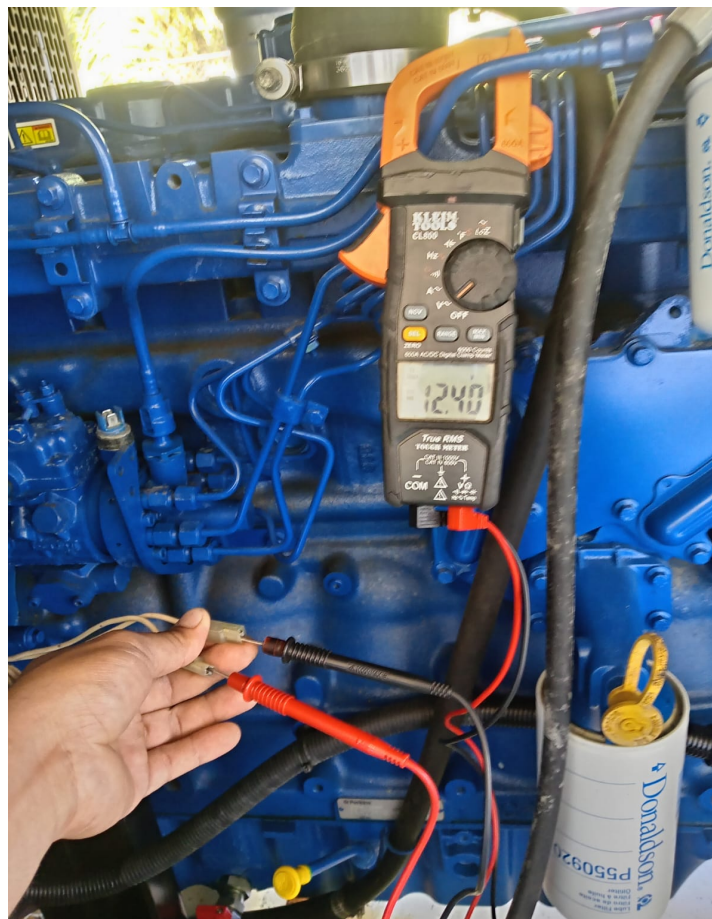

Carlos Santamaría
Realizado por: Ing. Carlos Santamaría

